Ilikai Carpet Schedule

Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
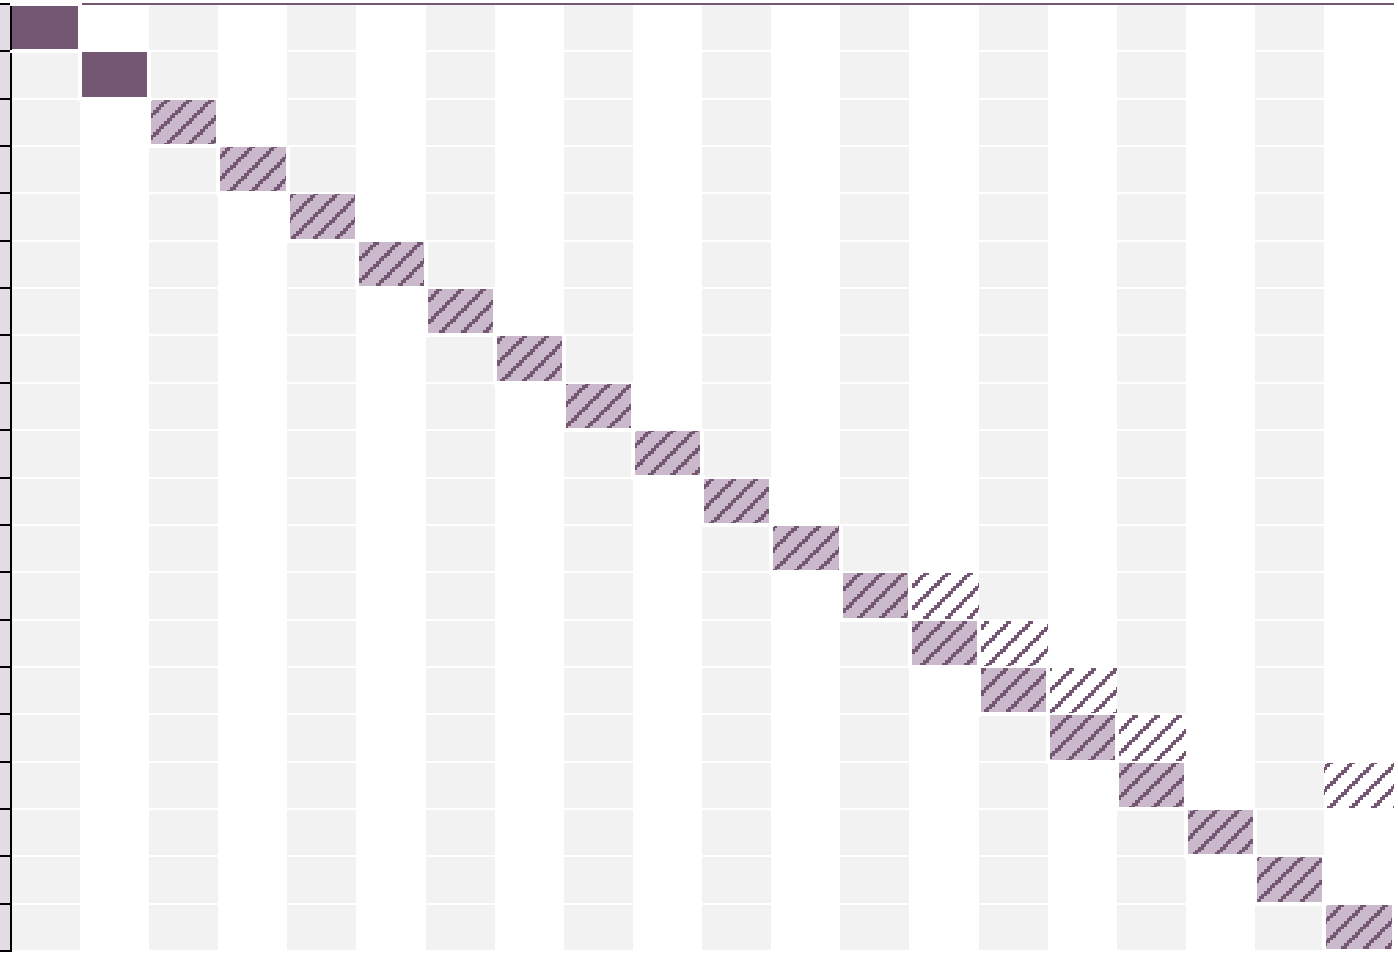
ACTIVITY	PLAN START	PLAN DAYS	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Carpet 21	9/3/18	5	9/4/18	4	100%
Carpet 20	9/10/18	4	9/10/18	4	100%
Carpet 19	9/14/18	4	9/14/18		0%
Carpet 18	9/20/18	4			0%
Carpet 17	9/26/18	4			0%
Carpet 16	10/2/18	4			0%
Carpet 15	10/8/18	4			0%
Carpet 14	10/12/18	4			0%
Carpet 13	10/18/18	4			0%
Carpet 12	10/24/18	4			0%
Carpet 11	10/30/18	4			0%
Carpet 10	11/5/18	4			0%
Carpet 9	11/9/18	4			0%
Carpet 8	11/15/18	4			0%
Carpet 7	11/26/18	4			0%
Carpet 6	11/30/18	4			0%
Carpet 5	12/6/18	4			0%
Carpet 4	12/12/18	4			0%
Carpet 3	12/18/18	4			0%
Carpet PH	1/2/19	4			0%
